

Neukonzeption und Sanierung der KGS Merl

**Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe,
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

20.11.2018

KGS Merl – Vorbereitung Gebäudehülle



KGS Merl – Dachflächenabdichtung



KGS Merl – Dachflächen Attikaausbildung



KGS Merl – Dachdurchbruch Aufzugsschacht




EG Ausführungsplanung

Erweiterung EG

EG 31 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 32 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 33 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 34 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 35 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz
--	--	--	--	--

EG 31 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 32 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 33 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 34 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz	EG 35 VC Mängel V2 L: 1.00m B: 2.00m H: 2.00m G: Abgehängte Akustik M: Plasterputz
--	--	--	--	--

1. OG Ausführungsplanung

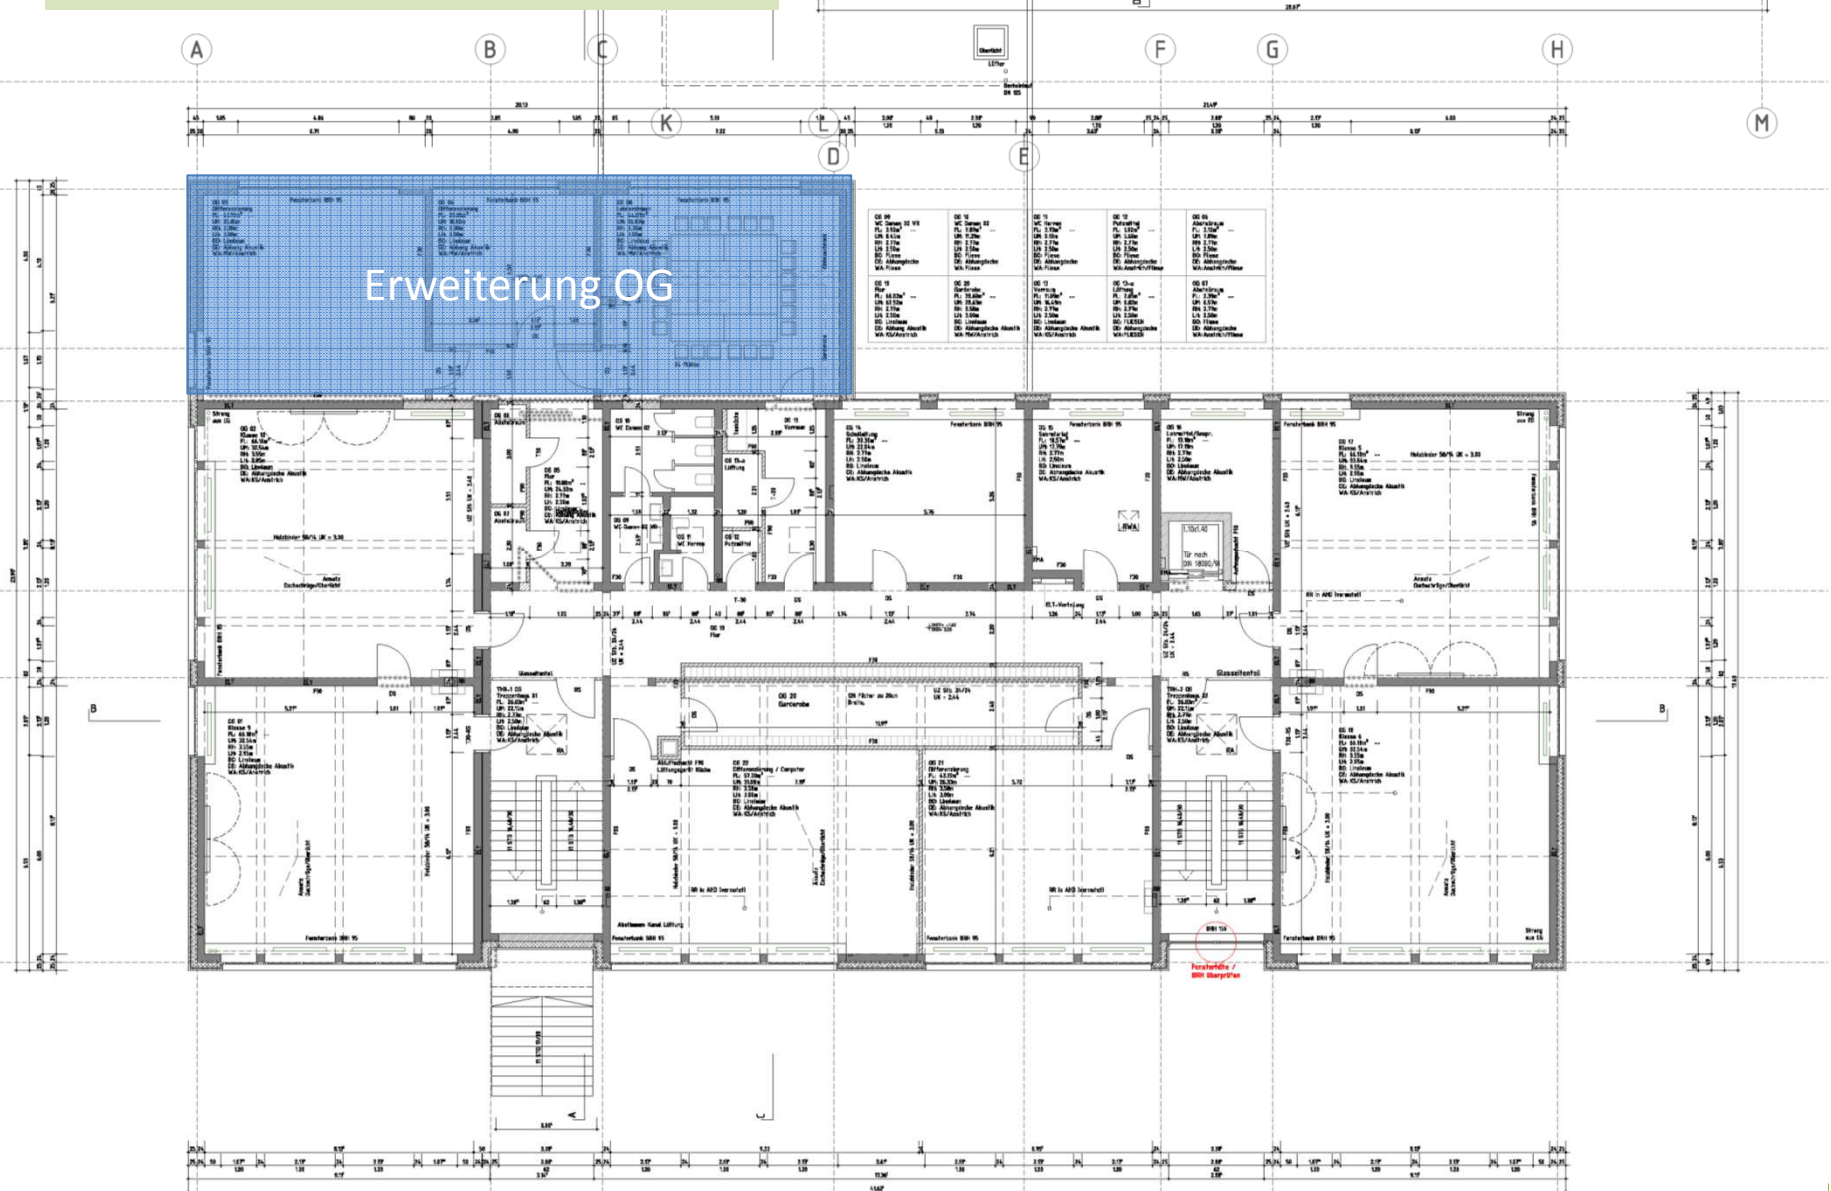


KGS Merl – Anbau / Erweiterung



KGS Merl – Gründung Anbau / Erweiterung



Erdgeschoss Schulgebäude

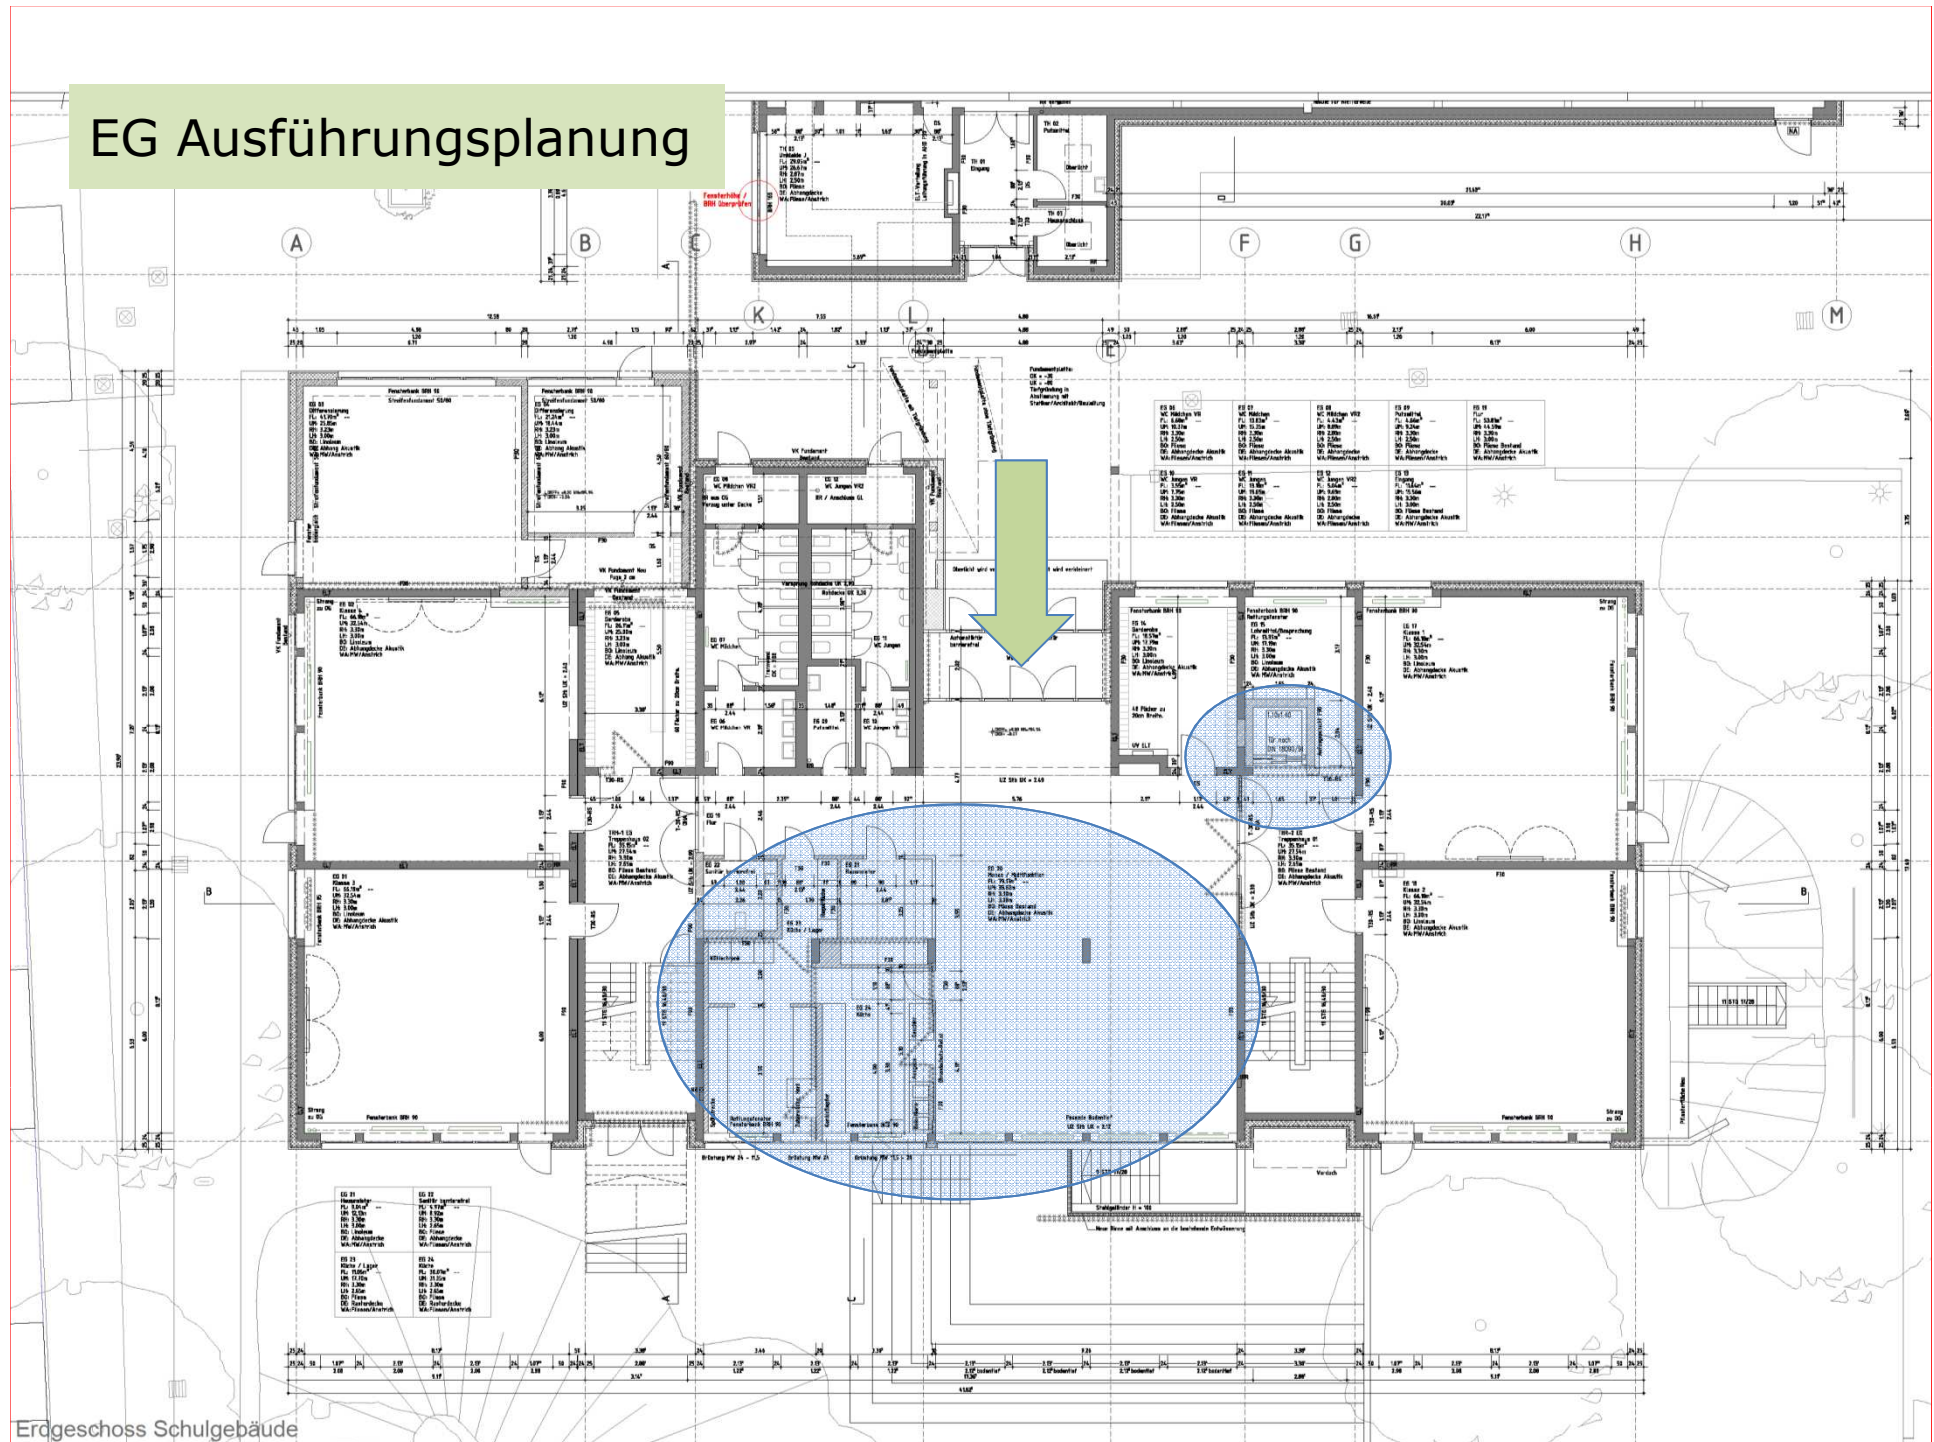

KGS Merl – Rohbau / Trockenbau



KGS Merl – Rohbau / Trockenbau



KGS Merl – Rohbau / Trockenbau




KGS Merl – Rohbau / Trockenbau






1. OG Ausführungsplanung

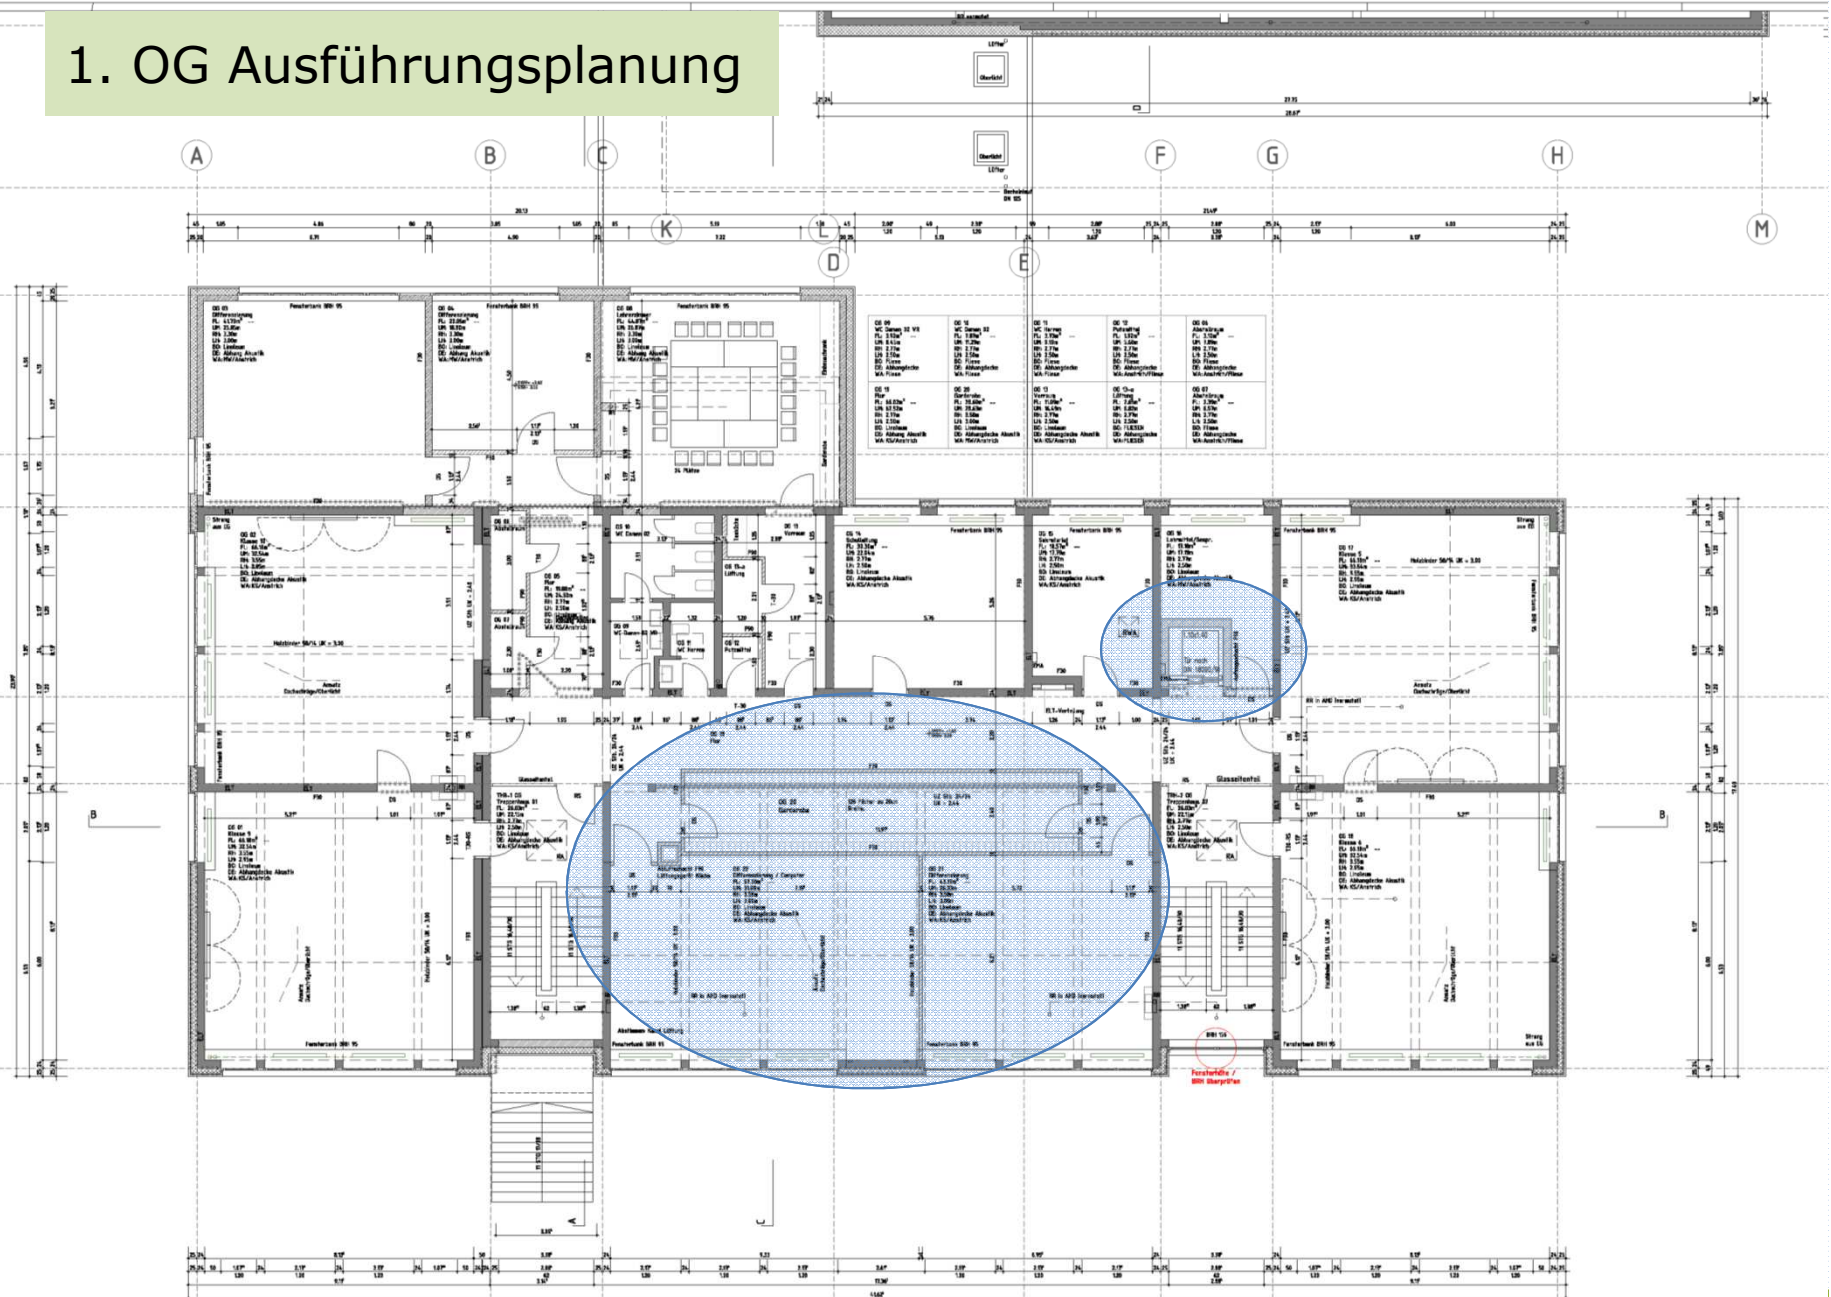

KGS Merl – Rohbau / Trockenbau



KGS Merl – Rohbau / Trockenbau

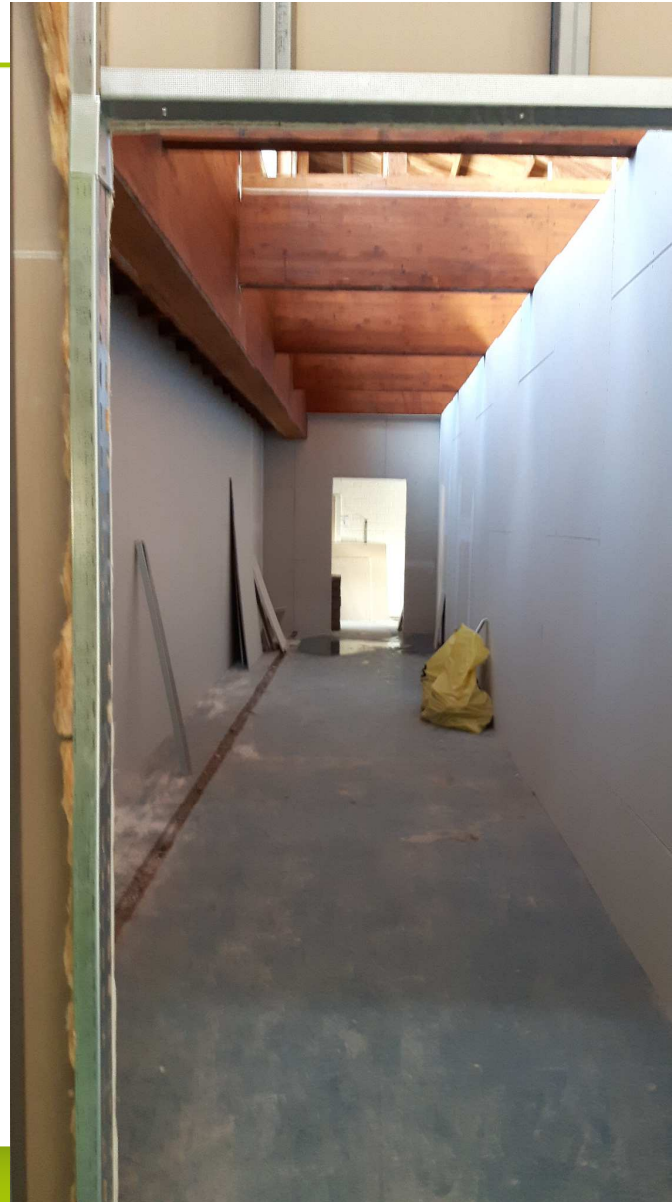


KGS Merl – Rohbau / Trockenbau





KGS Merl – Rohbau / Trockenbau

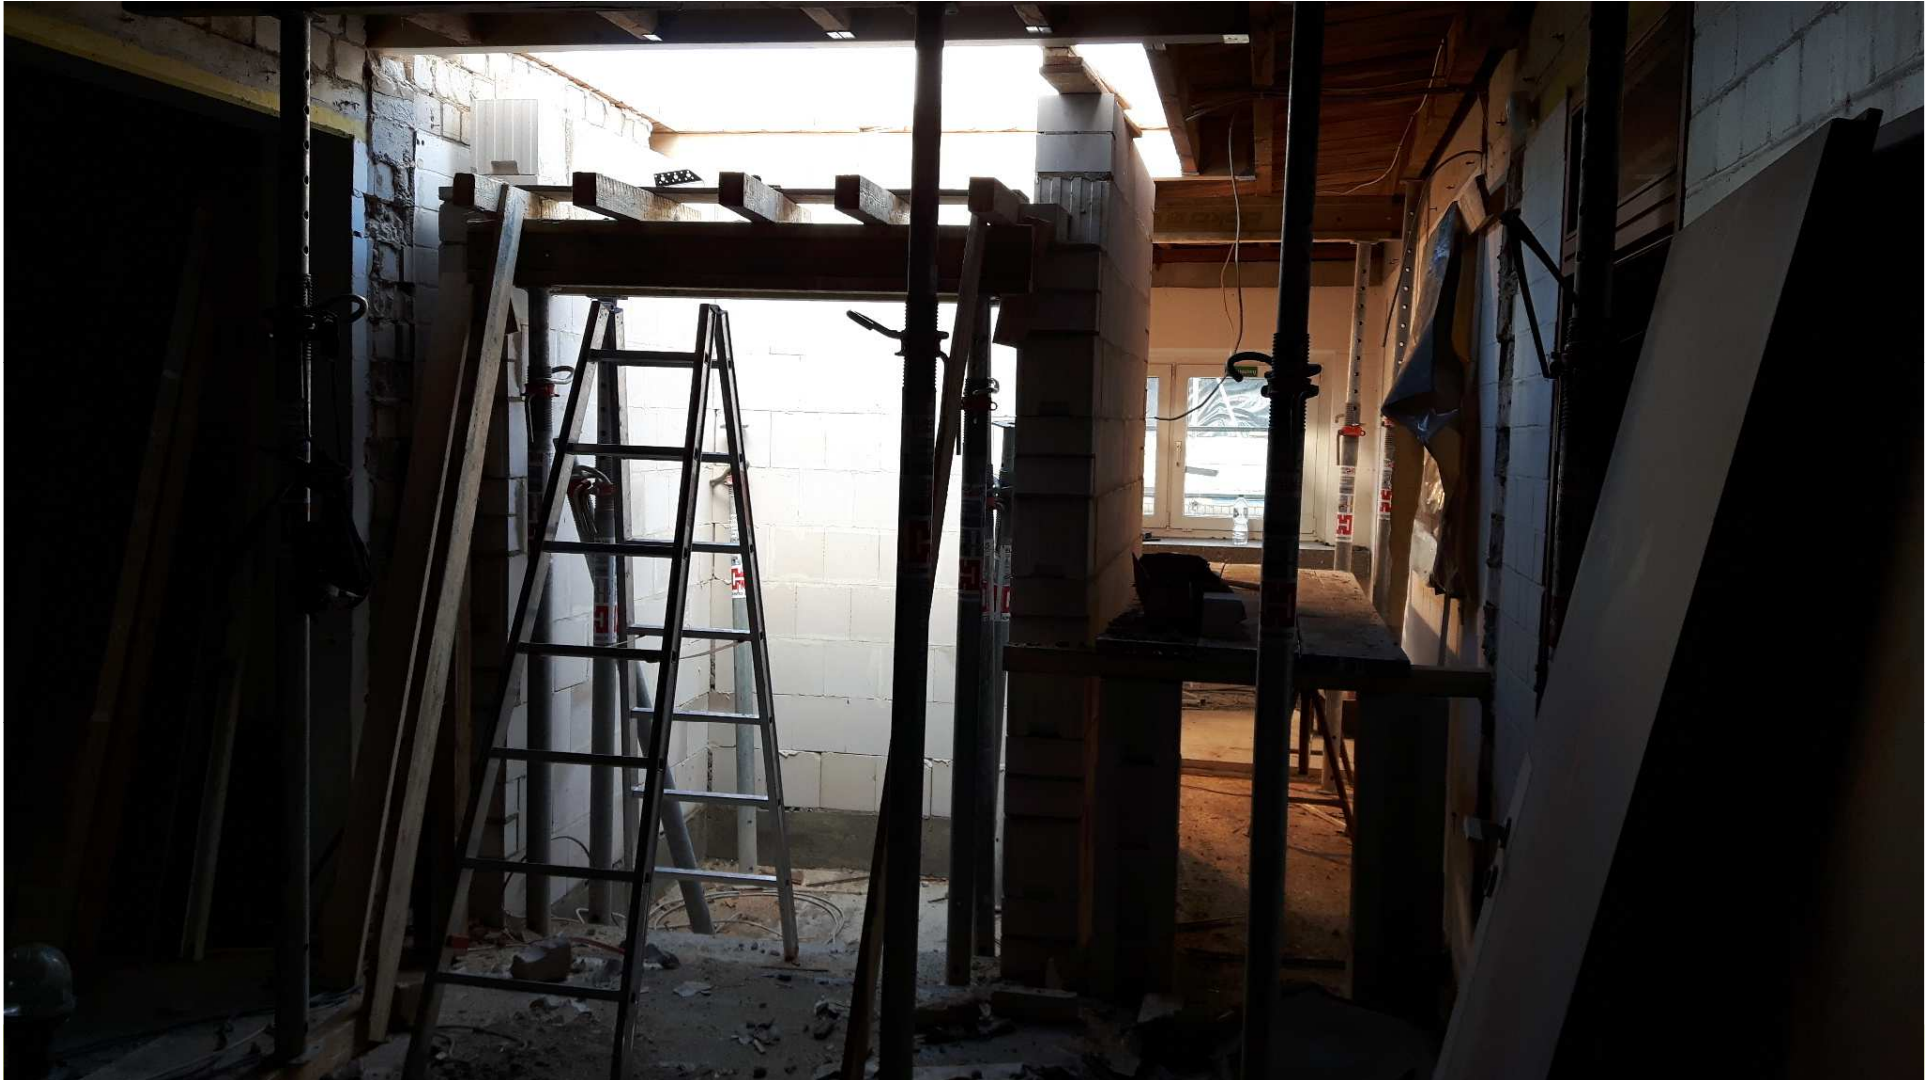

... Zeitplan KGS Merl

- Ende Juli 2018 Beginn der Bauarbeiten
- August - September Entkernung und Abbruch
- September Dachdeckerarbeiten
 Rohbauarbeiten Neubau und Ausbau
- Oktober Trockenbau
- **November** Fassade mit Fensteranlagen
 Technische Gebäudeausstattung (TGA)
- Dezember Aufzugsanlage

... Zeitplan KGS Merl

- Januar 2019 Fliesen
Abhangdecken
- März Kanalsanierung
- Ende Mai Fertigstellung der Bauarbeiten
- Juni – Juli Reserve
- Sommerferien 2019 Einzug in die renovierte Schule
(15.07. – 27.08.2019)

KGS Merl – Einbrüche & Baustellenvandalismus



KGS Merl – Einbrüche & Baustellenvandalismus



KGS Merl – Einbrüche & Baustellenvandalismus



KGS Merl – Einbrüche & Baustellenvandalismus



KGS Merl – Wachschatz





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
