

Neukonzeption und Sanierung der KGS Merl

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe,
Wirtschaftsförderung und Tourismus

06.02.2018

Zeitplan

- 15.03.2017 Vorstellung / Beschluss der Sanierungskonzepte
- 20.06.2017 Auftragsvergabe der Generalplanerleistung KGS
- 12.09.2017 Beschluss zur Neukonzeptionierung der KGS
- 19.09.2017 Elterninformationsabend
- 05.10.2017 Einreichung Bauantrag Containerschule
- 22.11.2017 Erteilung Baugenehmigung Containerschule
- 17.01.2018 Auftragsvergabe Erstellung der Containerschule,
nach zweiter Ausschreibung
Verschiebung Umzug von den Ostern- in die
Sommerferien 2018
- 05.02.2018 Elterninformationsschreiben KGS & GGS


Zeitplan

-
- 01.12.2017 Einreichung Bauantrag KGS
 - 05.02.2018 Erteilung Baugenehmigung KGS
 - Ende Januar Planung/ TGA-Planung abgeschlossen



EG Bauantragsplanung

1. OG Bauantragsplanung

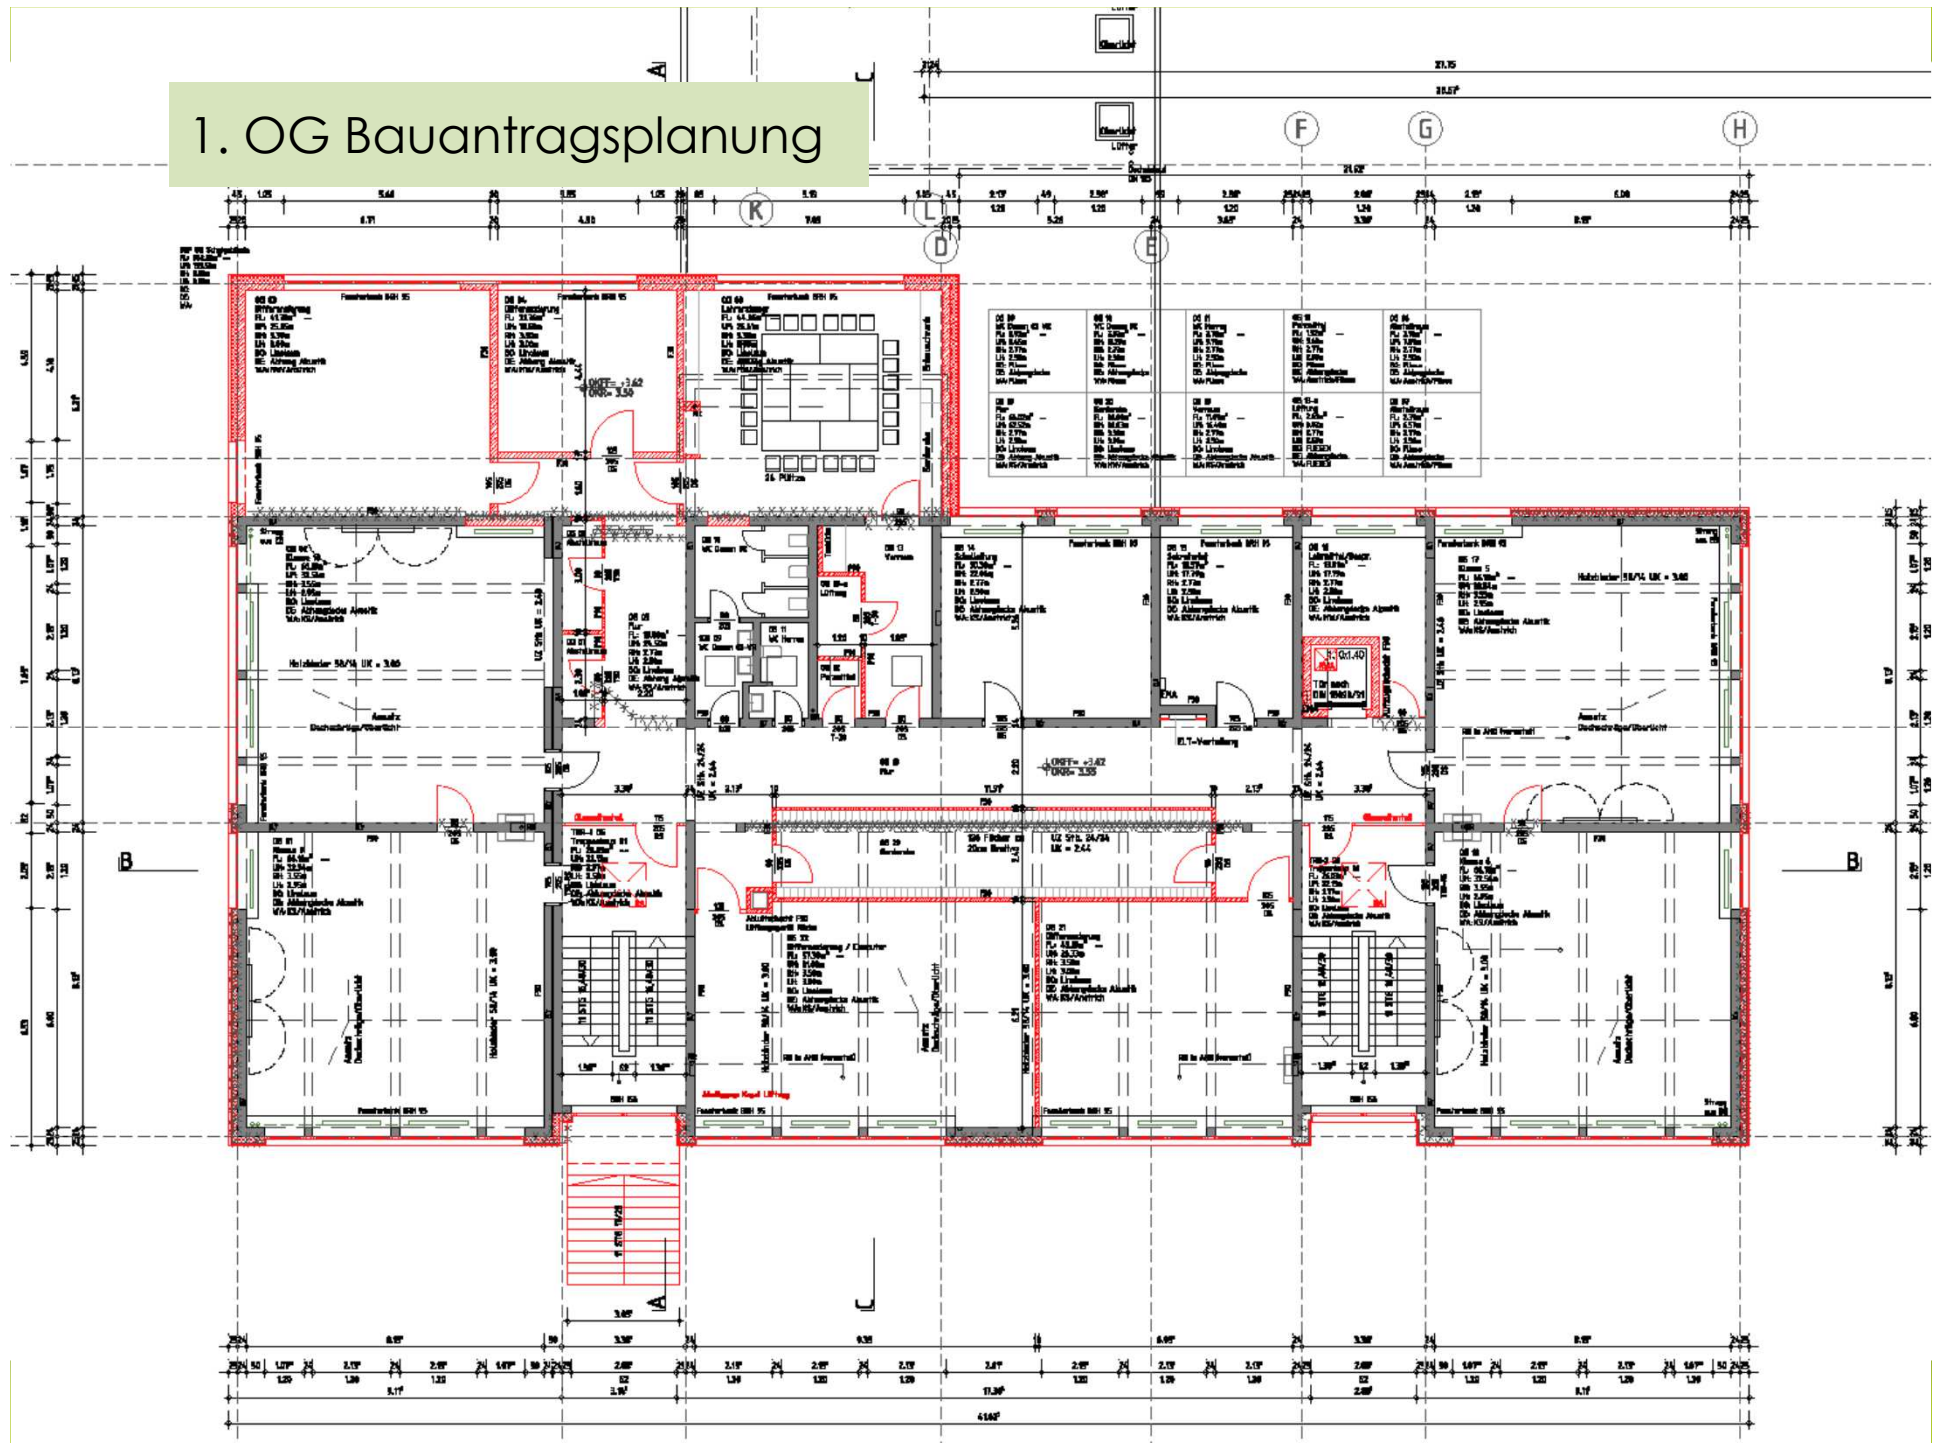

Zeitplan

-
- | | |
|---------------------|--|
| • Ende Januar | Beginn der Ausschreibungsphase |
| • bis Mitte Juli | Auftragsvergabe der Gewerke |
| • Juni 2018 | Aufstellung der Containerschule |
| • Sommerferien 2018 | Auszug aus der Schule in Containerschule |
| • Ende Juni 2018 | Beginn der Bauarbeiten, zweite Ferienwoche |
| • Mitte Mai 2019 | Fertigstellung der Bauarbeiten |
| • Juni – Juli 2019 | Reserve |
| • Sommerferien 2019 | Einzug in die renovierte Schule |
| • Sommerferien 2019 | Umzug GGS in die Containerschule |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
